

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВТОРОГО ЭТАПА ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Наименование образовательной организации: ГБПОУ «СОМК»

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а

Границы процесса: выход Приказа Минздрава России от 01.06.2021 г. №566 "Об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское образование" от 01.06.2021 № 566 до 15.07.2021г. завершение аудита (защита презентации проекта)

Дата начала проекта: 01.06.2021

Дата окончания проекта: 15.07.2021

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА

- Система аккредитации позволяет вносить данные по аккредитуемым в электронный чек – лист непосредственно в момент оценки аккредитуемого.
- Временные затраты сотрудников ГБПОУ «СОМК» ЦДПО, отрыв от основной деятельности.
- Материальные затраты на подготовку чек – листов для 2 этапа аккредитации не компенсируются, процедура аккредитации проводится бесплатно.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

- Оптимизация времени затраченного на 1 аккредитуемого при подготовке чек-листов (2 этап) для членов аккредитационной подкомиссии с 3 мин. до 0 мин.
- Оптимизация времени затраченного сотрудником ГБПОУ «СОМК» на внесение чек-листа 1 аккредитуемого (2 этап) с 12 мин. до 0 мин.
- Оптимизация материальных затрат на бумагу при оценке 1 аккредитуемого (2 этап) с 17.82 руб. до 0 руб.
- Оптимизация затрат на печать чек-листов на 1 аккредитуемого (2 этап) с 102.6 руб. до 0 руб.

ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

- Эксперты аккредитационной подкомиссии не проводят «двойную работу» при оценке аккредитуемого на 2 этапе аккредитации.
- Сотрудники ГБПОУ «СОМК» не вовлечены в процесс внесения чек - листов.
- Отсутствуют материальные затраты на бумагу и печать чек -листов для 2 этапа аккредитации.
- Экологичность 2 этапа аккредитации.

КОМАНДА ПРОЕКТА

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА



ГБПОУ «СОМК»

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ



**Левина Ирина Анатольевна,
директор ГБПОУ «СОМК»**

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА



**Михайлева Елена Анатольевна,
заместитель директора по
дополнительному
профессиональному образованию
ГБПОУ «СОМК»**




**Бежашвили Георгий Давидович,
заведующий отделом
дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения
Центра дополнительного
профессионального образования
ГБПОУ «СОМК»**



**Газетдинова Надежда Ивановна,
преподаватель, заведующий
симуляционными кабинетами
ГБПОУ «СОМК»**

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

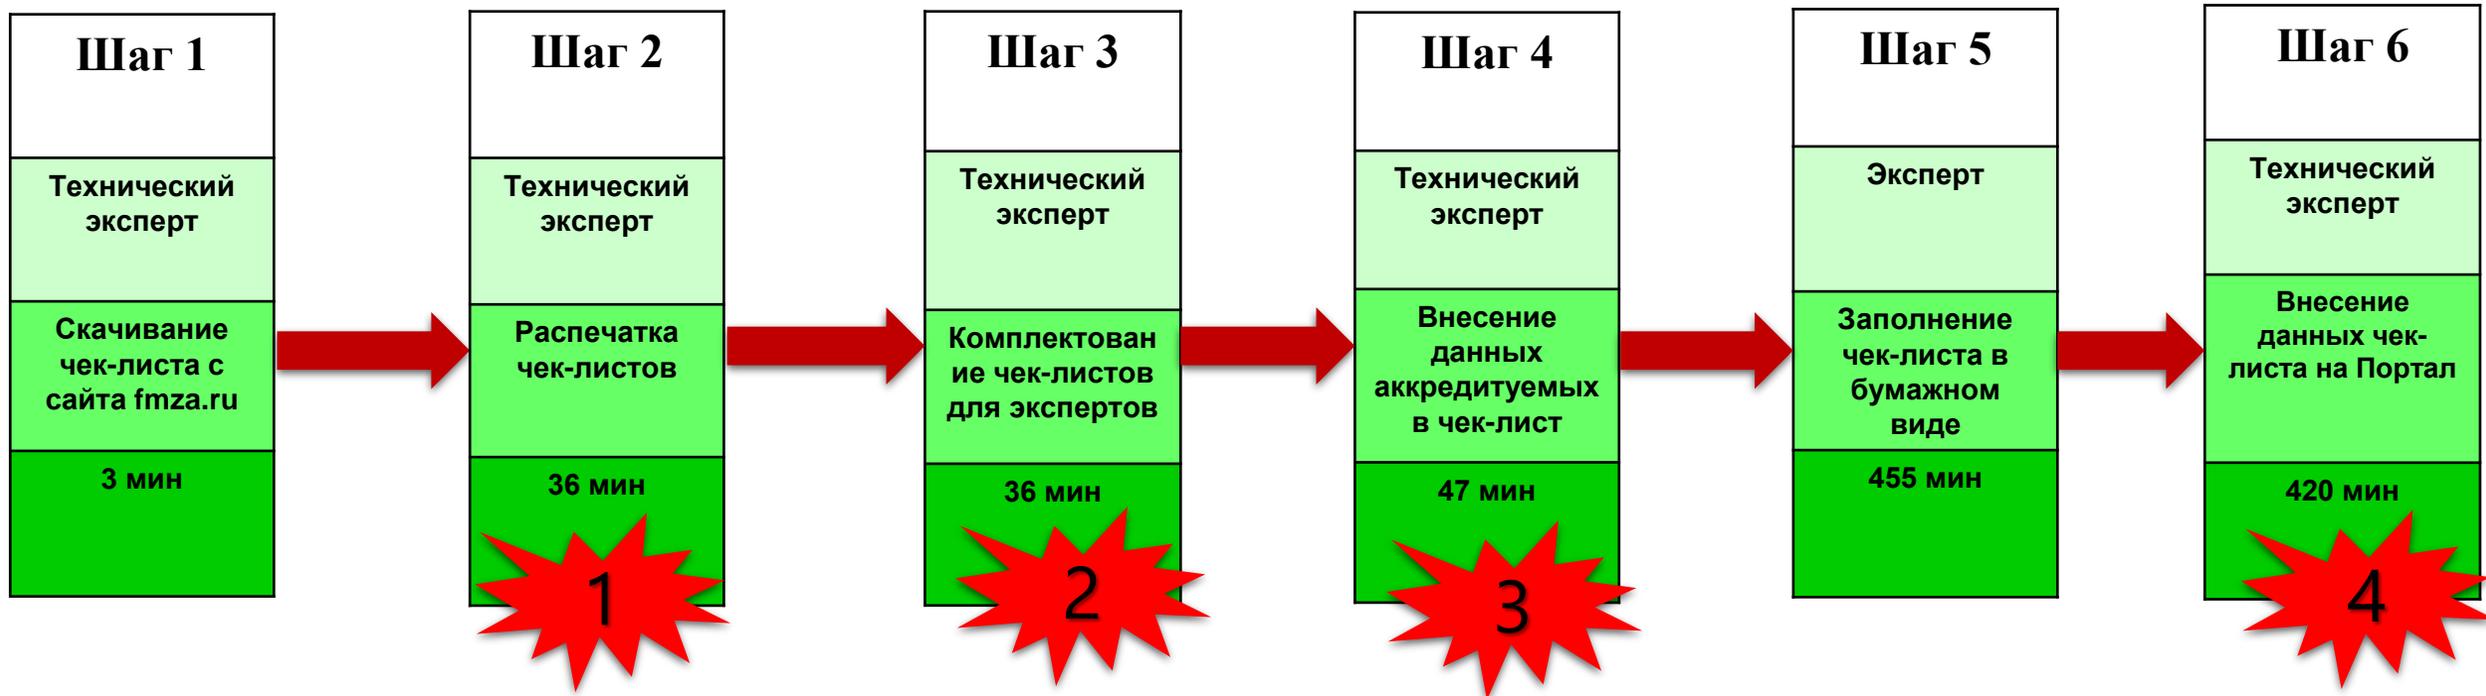

ВПП (время протекания процесса) = 997 мин

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОТЕРИ/ПРОБЛЕМЫ

1. Финансовые затраты на бумагу и картридж
2. Временные затраты на комплектование чек-листов для экспертов
3. Временные затраты на внесение данных аккредитуемого в чек-листы
4. Временные затраты на внесение данных чек-листа на Портал

	Исполнитель
	Описание шага процесса
	Продолжительность

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



1 - низкая информированность экспертов аккредитационных комиссий о техническом сопровождении процедуры первичной специализированной аккредитации

1 - отсутствие точки доступа к сети интернет для подключения ноутбуков
2 - отсутствие на площадке ноутбуков для внесения чек-листов;
3 - эксперты аккредитационных комиссий не обучены процедуре внесения чек-листов в электронном виде

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблемы	Первопричины	Решения	Вклад в достижение цели
Отсутствие точки доступа к сети интернет для подключения ноутбуков	На площадку не проведен интернет	Установка wi-fi роутеров к интернету со 100% покрытием аккредитационной площадки	Оптимизация времени затраченного сотрудником ГБПОУ «СОМК» на внесение чек-листа 1 аккредитуемого (2 этап) с 12 мин. до 0 мин.
Отсутствие на площадке ноутбуков для внесения чек-листов	Для работы экспертов требовалась дополнительная закупка ноутбуков	В кабинете информационных технологий есть ноутбуки которые используются для проведения 1 этапа аккредитации. Расписание аккредитации сделали таким образом, что на второй этап аккредитации они были свободны	Оптимизация времени затраченного на 1 аккредитуемого при подготовке чек-листов (2 этап) для членов аккредитационной подкомиссии с 3 мин. до 0 мин.
Эксперты аккредитационных комиссий не обучены процедуре внесения чек-листов в электронном виде	Заполнение чек – листов экспертами проводилось в письменном виде	Проведение обучения экспертов перед вторым этапом аккредитации	Оптимизация материальных затрат на бумагу при оценке 1 аккредитуемого (2 этап) с 17.82 руб. до 0 руб. Оптимизация затрат на печать чек-листов на 1 аккредитуемого (2 этап) с 102.6 руб. до 0 руб.

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

1. ОТСУТСТВИЕ ТОЧКИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОУТБУКОВ

Почему?	Потому что на площадку не проведен интернет
Почему?	Потому что отсутствовала потребность в интернете
Почему?	Потому что ранее не проводилась процедура аккредитации
Почему?	Потому что отсутствовал Приказ
Почему?	Потому что проводилась сертификация

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

2. ОТСУТСТВИЕ НА ПЛОЩАДКЕ НОУТБУКОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЧЕК-ЛИСТОВ

Почему?	Потому что ранее отсутствовала потребность в использовании ноутбуков
Почему?	Потому что ранее не заполнялись чек-листы в электронном виде
Почему?	Потому что ранее не проводилась процедура аккредитации
Почему?	Потому что отсутствовал Приказ
Почему?	Потому что проводилась сертификация

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

3. ЭКСПЕРТЫ АККРЕДИТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ НЕ ОБУЧЕНЫ ПРОЦЕДУРЕ ВНЕСЕНИЯ ЧЕК-ЛИСТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Почему?	Потому что ранее отсутствовала потребность в использовании ноутбуков
Почему?	Потому что ранее не заполнялись чек-листы в электронном виде
Почему?	Потому что ранее не проводилась процедура аккредитации
Почему?	Потому что отсутствовал Приказ
Почему?	Потому что проводилась сертификация

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ВПП (время протекания процесса) = 456 мин

Экономия времени протекания процесса = 541 мин

	Исполнитель
	Описание шага процесса
	Продолжительность

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
1	Подготовка и открытие проекта	01.06.21-07.06.21	<ul style="list-style-type: none">✓ Формирование команды проекта✓ Формулирование проблемы✓ Организация стенда проекта	Михайлева Е.А. Бежашвили Г.Д.
2	Диагностика и целевое состояние	08.06.21-21.06.21	<ul style="list-style-type: none">✓ Разработка текущей карты процесса✓ Поиск и выявление проблем✓ Разработка идеальной карты процесса✓ Разработка целевой карты процесса✓ Разработка тактического плана реализации проекта	Михайлева Е.А. Бежашвили Г.Д. Газетдинова Н.И.
3	Внедрение улучшений	25.06.2021	<ul style="list-style-type: none">✓ Реализация плана мероприятий согласно утвержденным срокам	Бежашвили Г.Д. Газетдинова Н.И.
4	Закрепление результатов и закрытие проекта	29.06.21-15.07.21	<ul style="list-style-type: none">✓ Мониторинг устойчивости улучшений, проведение корректирующих действий✓ Стандартизация процесса	Михайлева Е.А. Бежашвили Г.Д. Газетдинова Н.И.

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ВПП (время протекания процесса) = 456 мин
Экономия времени протекания процесса = 541 мин

	Исполнитель
	Описание шага процесса
	Продолжительность

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заполнение чек-листа в бумажном варианте

Заполнение чек-листа в электронном виде



88078389

Навигация по тесту

Выполнение остановки артериального кровотечения с помощью жгута

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

Вы фельдшер, находитесь в отделе за городом. Недалеко от вас послышалась шум и крики: «Помогите кто-нибудь, тут мужчина плохой». Вы прибыли на место и увидели мужчину без явных признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

3. Вы фельдшер скорой помощи прибыли по вызову на падение человека с высоты. При осмотре в верхней трети внутренней поверхности плеча открытая рана, из которой пульсирующей струей поступает алая кровь. Выполните остановку артериального кровотечения с помощью жгута.

Вы фельдшер скорой помощи, прибыли к мужчине 30 лет. Со слов родственников некоторо время назад в состоянии алкогольного опьянения он съел упаковку средства от моли. Выполните процедуру промывания желудка.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


БЫЛО

СТАЛО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые затраты на бумагу = **623,7 руб.**

Финансовые затраты на бумагу = **0 руб.**

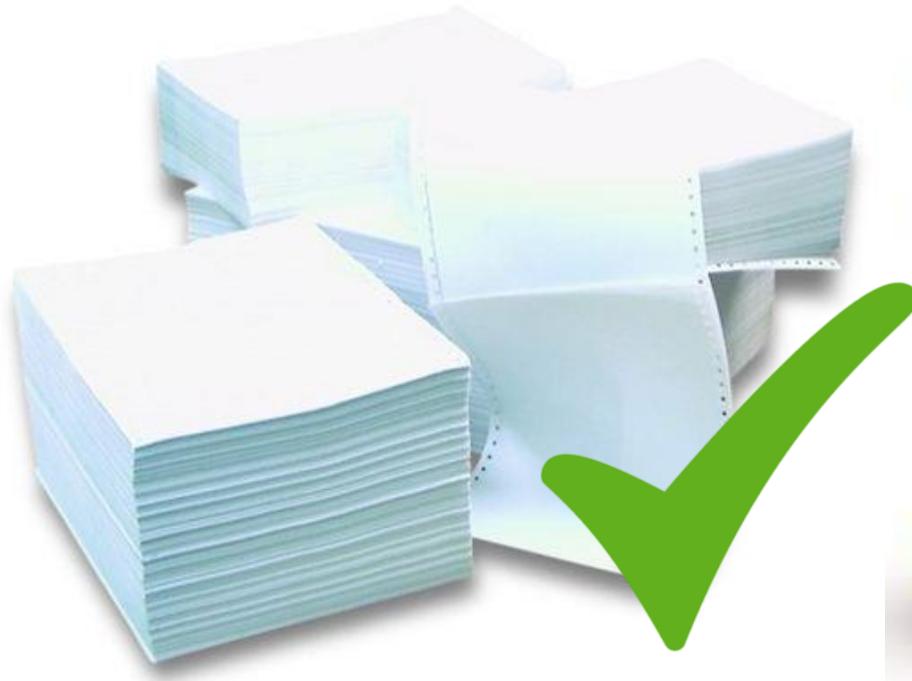

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые затраты на печать = **3591 руб.**

Финансовые затраты на печать = **0 руб.**



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Временные затраты экспертов = **997 мин.**

Временные затраты экспертов = **456 мин.**



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

1343 ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАНЫХ В 2021 ГОДУ

Финансовые затраты при использовании бумажных чек - листов = **164 373 руб.**

Финансовые затраты при использовании электронного чек - листа = **0 руб.**



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВТОРОГО ЭТАПА ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ»

Дата анализа	Время протекания процесса		Расхождение (+\ -)	Причина расхождения
	план	факт		
28.06.2021		997		
06.07.2021		456		

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА

СЕЙЧАС

МОЖЕТ СТАТЬ

2837 ВЫПУСКНИКОВ ПОДДЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУРЕ АККРЕДИТАЦИИ В 2020 ГОДУ

Финансовые затраты при использовании
бумажных чек - листов = **341 631 руб.**

Финансовые затраты при использовании
электронного чек - листа = **0 руб.**

